


villa 17

villa 18

FACADES NORD VILLAS 17 ET 18

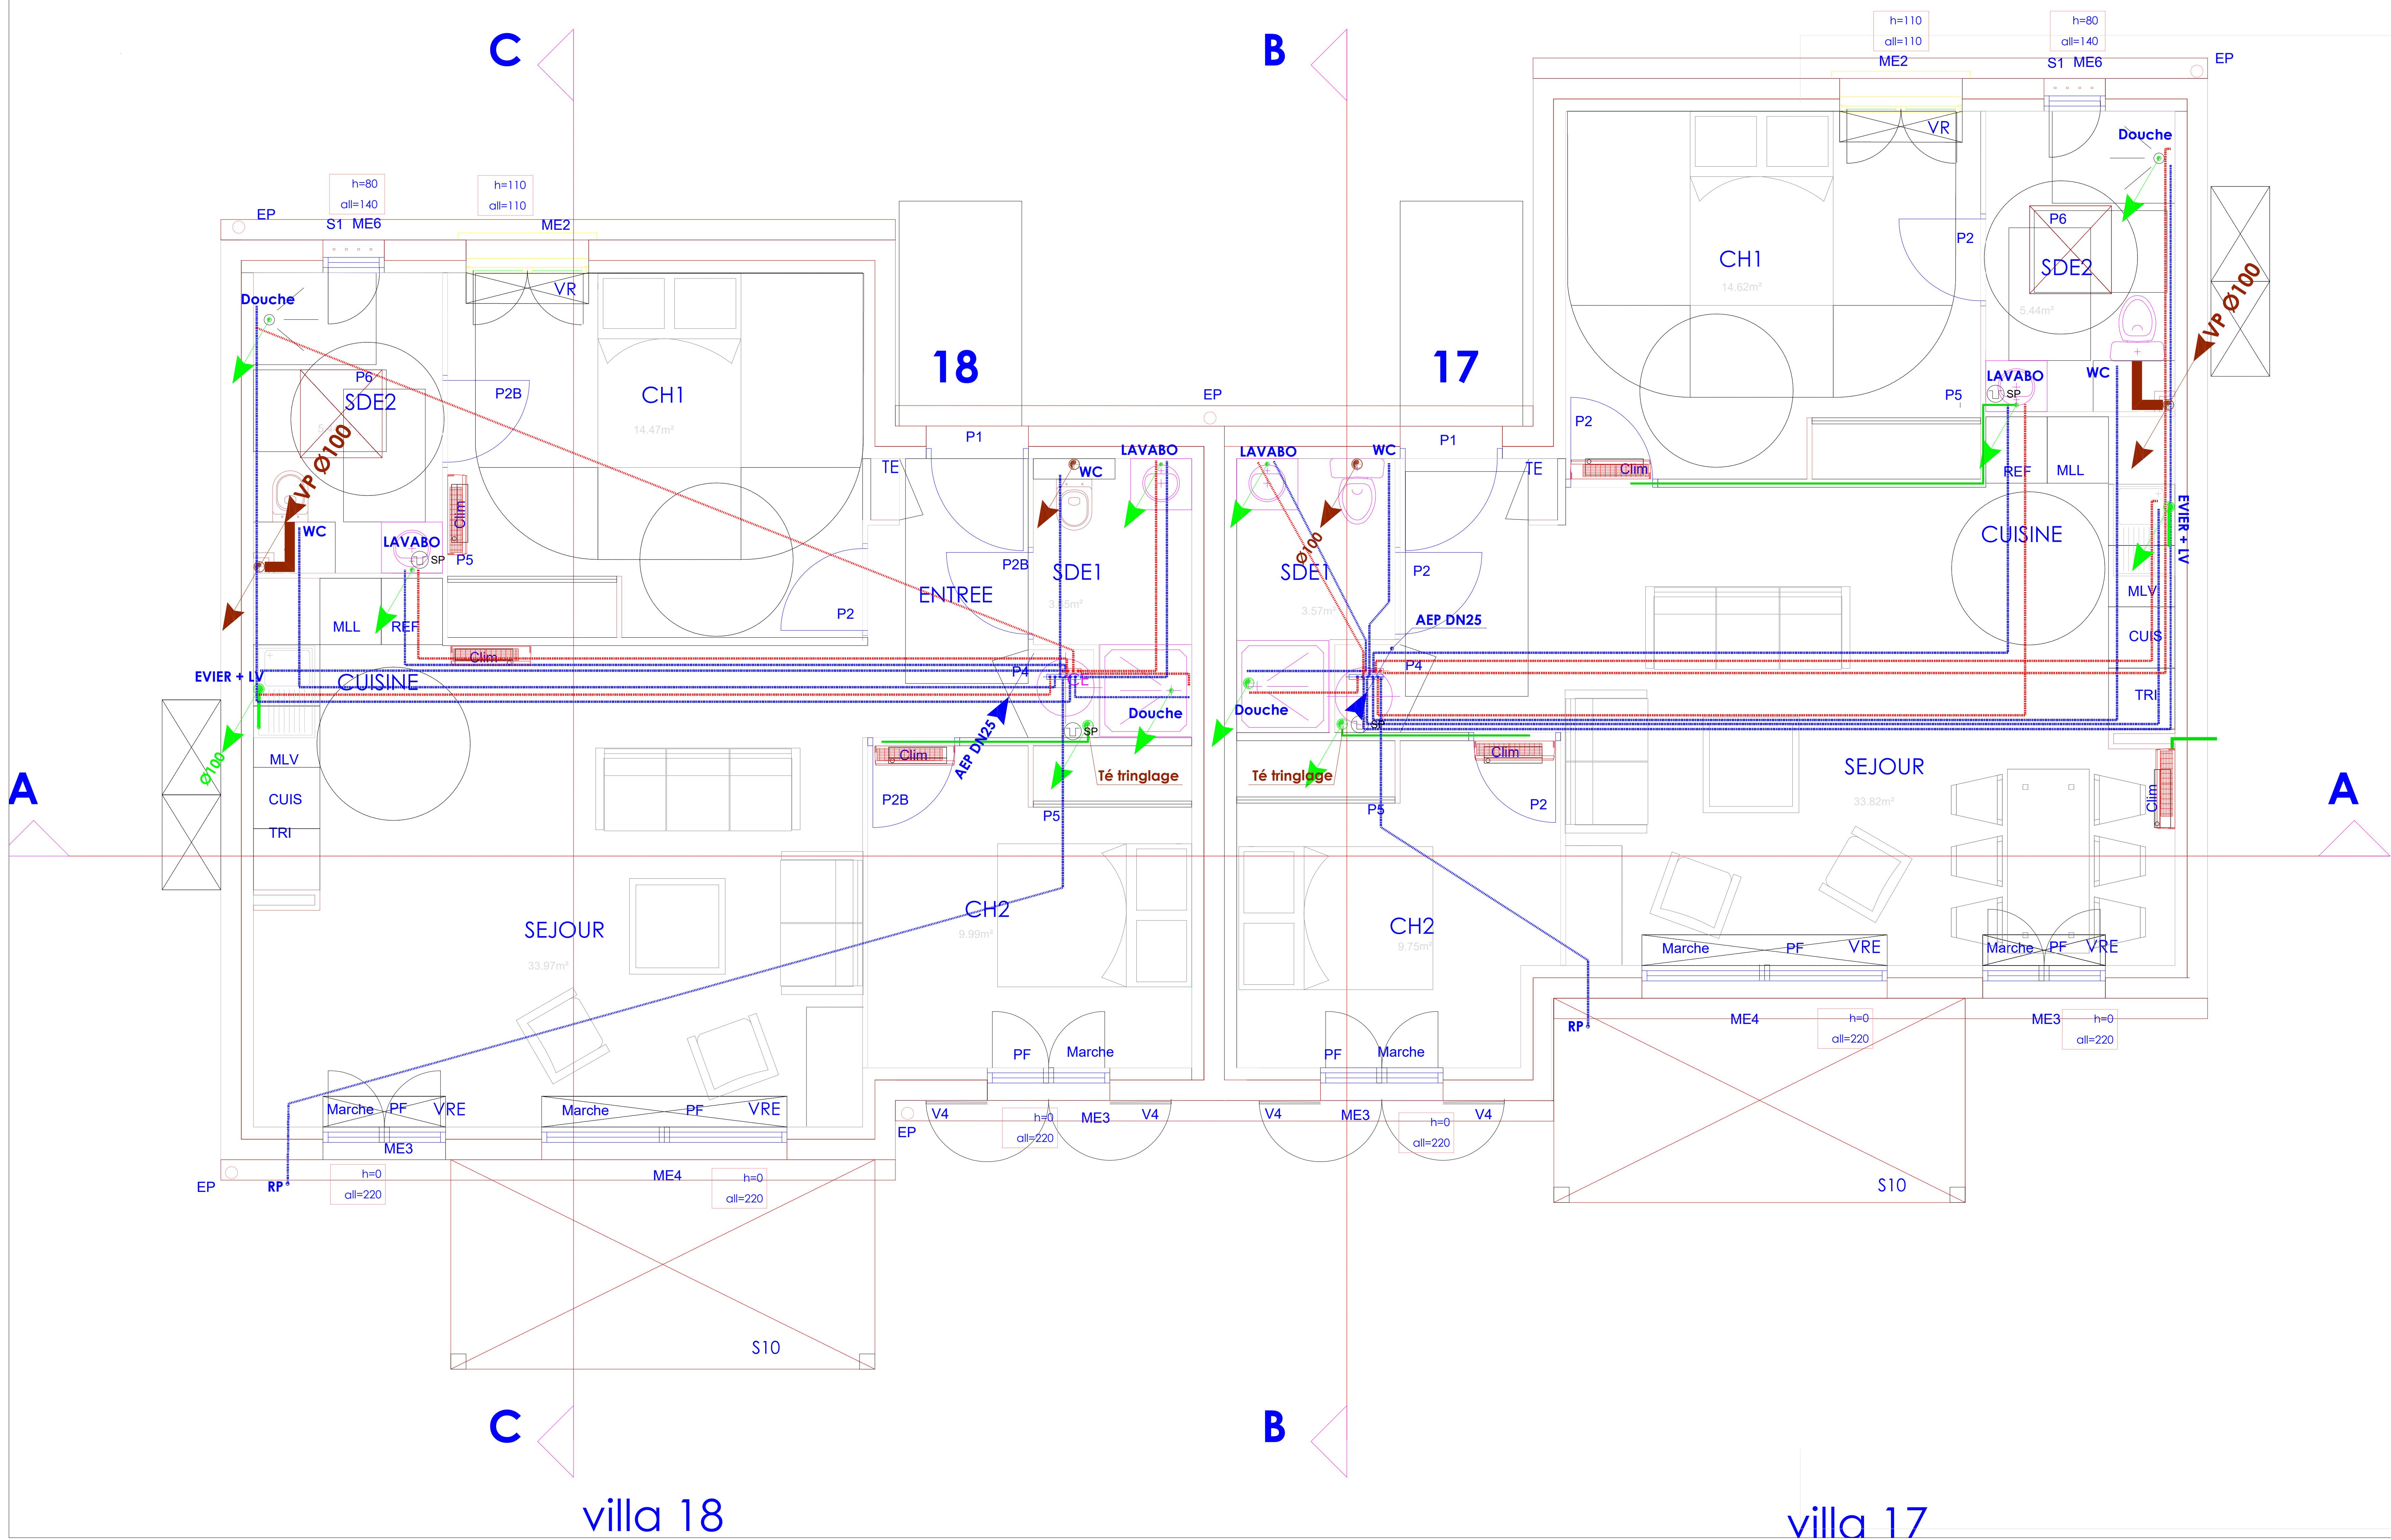

LEGENDE PLOMBERIE					
Eau froide sanitaire					
Eau chaude sanitaire					
Eaux usées					
Eaux vannes					
Condensats					
Siphon sec					
DEBIT DE BASE DES APPAREILS					
Désignation	Debit EF ECS	Quantité	Debit EV	Quantité	
apparel	UA	reconnues PPR	UA	chacune	
Lavabo	0.30	10/12	0.75	40	
douche	0.30	13/16	0.5	40	
ec.	0.12	16/20	1.5	100	
Baignoire	0.33	13/16	1.2	50	
Evier	0.20	13/16	0.75	40	
Lave-vaisselle	0.10	10/12	0.5	30	
rob. passage	0.33	13/16	0.5	30	
LEGENDE DIMENSIONNEMENT					
Vitesse réseau eau froide et eau chaude sanitaire : 1.5m/s en parties courbées et 3.0m/s en parties droites.					
perte EU, EV, EUS en Rdnr25					
perte EP en Rdnr 1.5%					

CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS
RUE NEUVE GRAND TERRE
13930 AUREILLE

VILLAS 17 - 18

MAITRISE D'OUVRAGE
SCCV GRANDE TERRE
837 BIS ALLÉE DE PARIS
LA SEYNE SUR MER

MAITRISE D'OEUVRE
AXXION
41 Rue Ribas
13770 VENELLES

BET FLUIDES CVC
AXIO INGENIERIE
393 Rue Etienne BUGATTI
66000 PERPIGNAN
axio.ingenierie@gmail.com



LOT PLOMBERIE,VMC & RAFFRAICHISSEMENT
PLAN PLOMBERIE EVACUATIONS RDC

Ind	Date	Modifications		Dessiné par:	Vérifié par:
0	07/07/2026	Création du document		EB	LG
A				Date:	Echelle:
B				07/07/2026	1:25
C				Visa :	
D					

NIVEAU	LOT	DOSSIER	PHASE	N° DOCUMENT	INDICE
R0	PB CVC		DCE	401	
